


国道279号 下北半島縦貫道路整備事業【県事業】

青森県 県土整備部 道路課

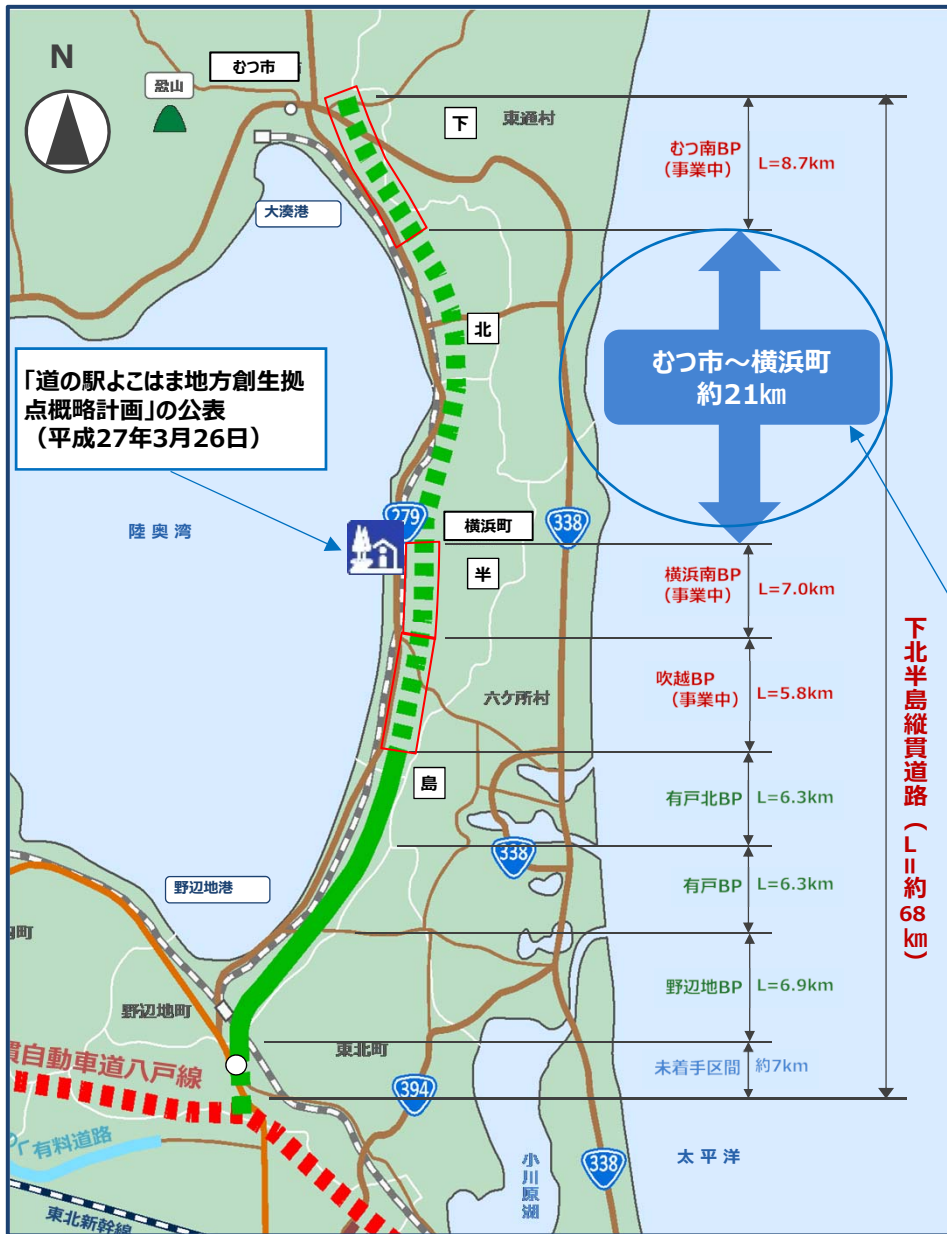

下北半島縦貫道路の整備状況 (H27.4月時点)

- ・地域高規格道路 (自動車専用道路)
- ・全体延長: 約68km
- ・第1種2 (3) 級、設計速度100 (80) km
- ・事業化率 (約60%)
- ・供用率 (約29%)

【供用済工区】・・・約19.5km

- ・野辺地BP: 6.9km (H17～) ※一部H16～
- ・有戸BP: 6.3km (H16～)
- ・有戸北BP: 6.3km (H24～)
- ・救急車退出路 (H19～)

【事業中工区】・・・約21.5km

- ・むつ南BP: 8.7km (H15～H30年代後半)
※部分供用を検討中
- ・横浜南BP: 7.0km (H25～H30年代)
- ・吹越BP: 5.8km (H20～H20年代後半)

未着手区間の取り組み状況

- (H22～H23) 第1回パブリックインボルブメント実施 (概略計画の公表)
- (H26) 第2回パブリックインボルブメント実施 (概略計画の見直し等)
- (H27.3.26) 概略計画 (見直し版) の公表


高規格幹線道路	供用中	■
	整備計画	■
	基本計画	■
地域高規格道路	供用中	■
	計画路線	■
	整備区間	■
	調査区間	■

有料道路	■
直轄国道	■
整備中	■
補助国道	■
県道・その他	■

平成26年4月現在

国道279号 二枚橋バイパス事業【県事業】


青森県 県土整備部 道路課

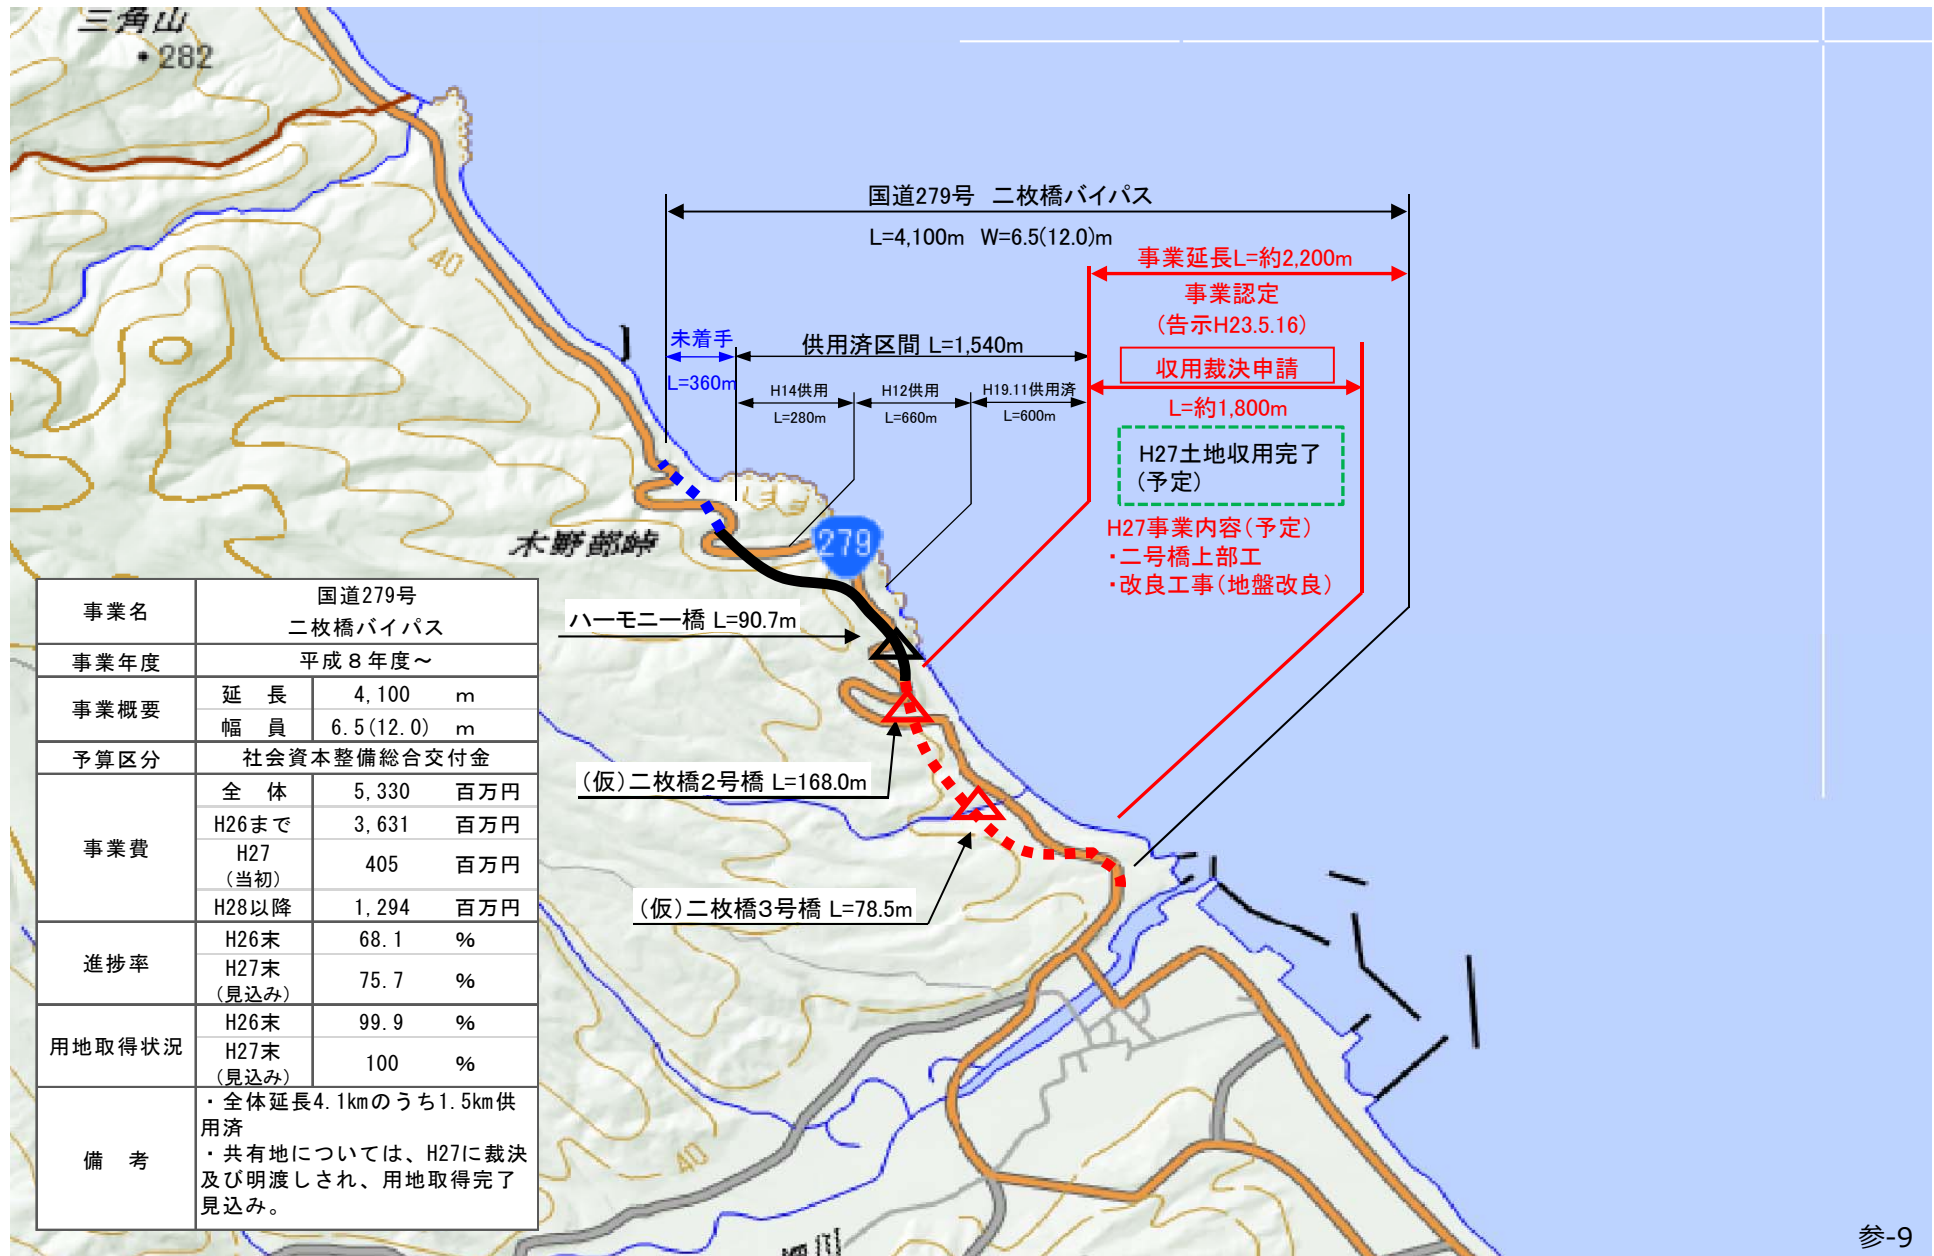

事業名	国道279号 二枚橋バイパス	
事業年度	平成8年度～	
事業概要	延長	4,100 m
	幅員	6.5(12.0) m
予算区分	社会資本整備総合交付金	
事業費	全体	5,330 百万円
	H26まで	3,631 百万円
	H27(当初)	405 百万円
	H28以降	1,294 百万円
進捗率	H26末	68.1 %
	H27末(見込み)	75.7 %
用地取得状況	H26末	99.9 %
	H27末(見込み)	100 %
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・全体延長4.1kmのうち1.5km供用済 ・共有地については、H27に裁決及び明渡しされ、用地取得完了見込み。 	

国道338号 大湊Ⅱ期バイパス事業【県事業】

青森県 県土整備部 道路課

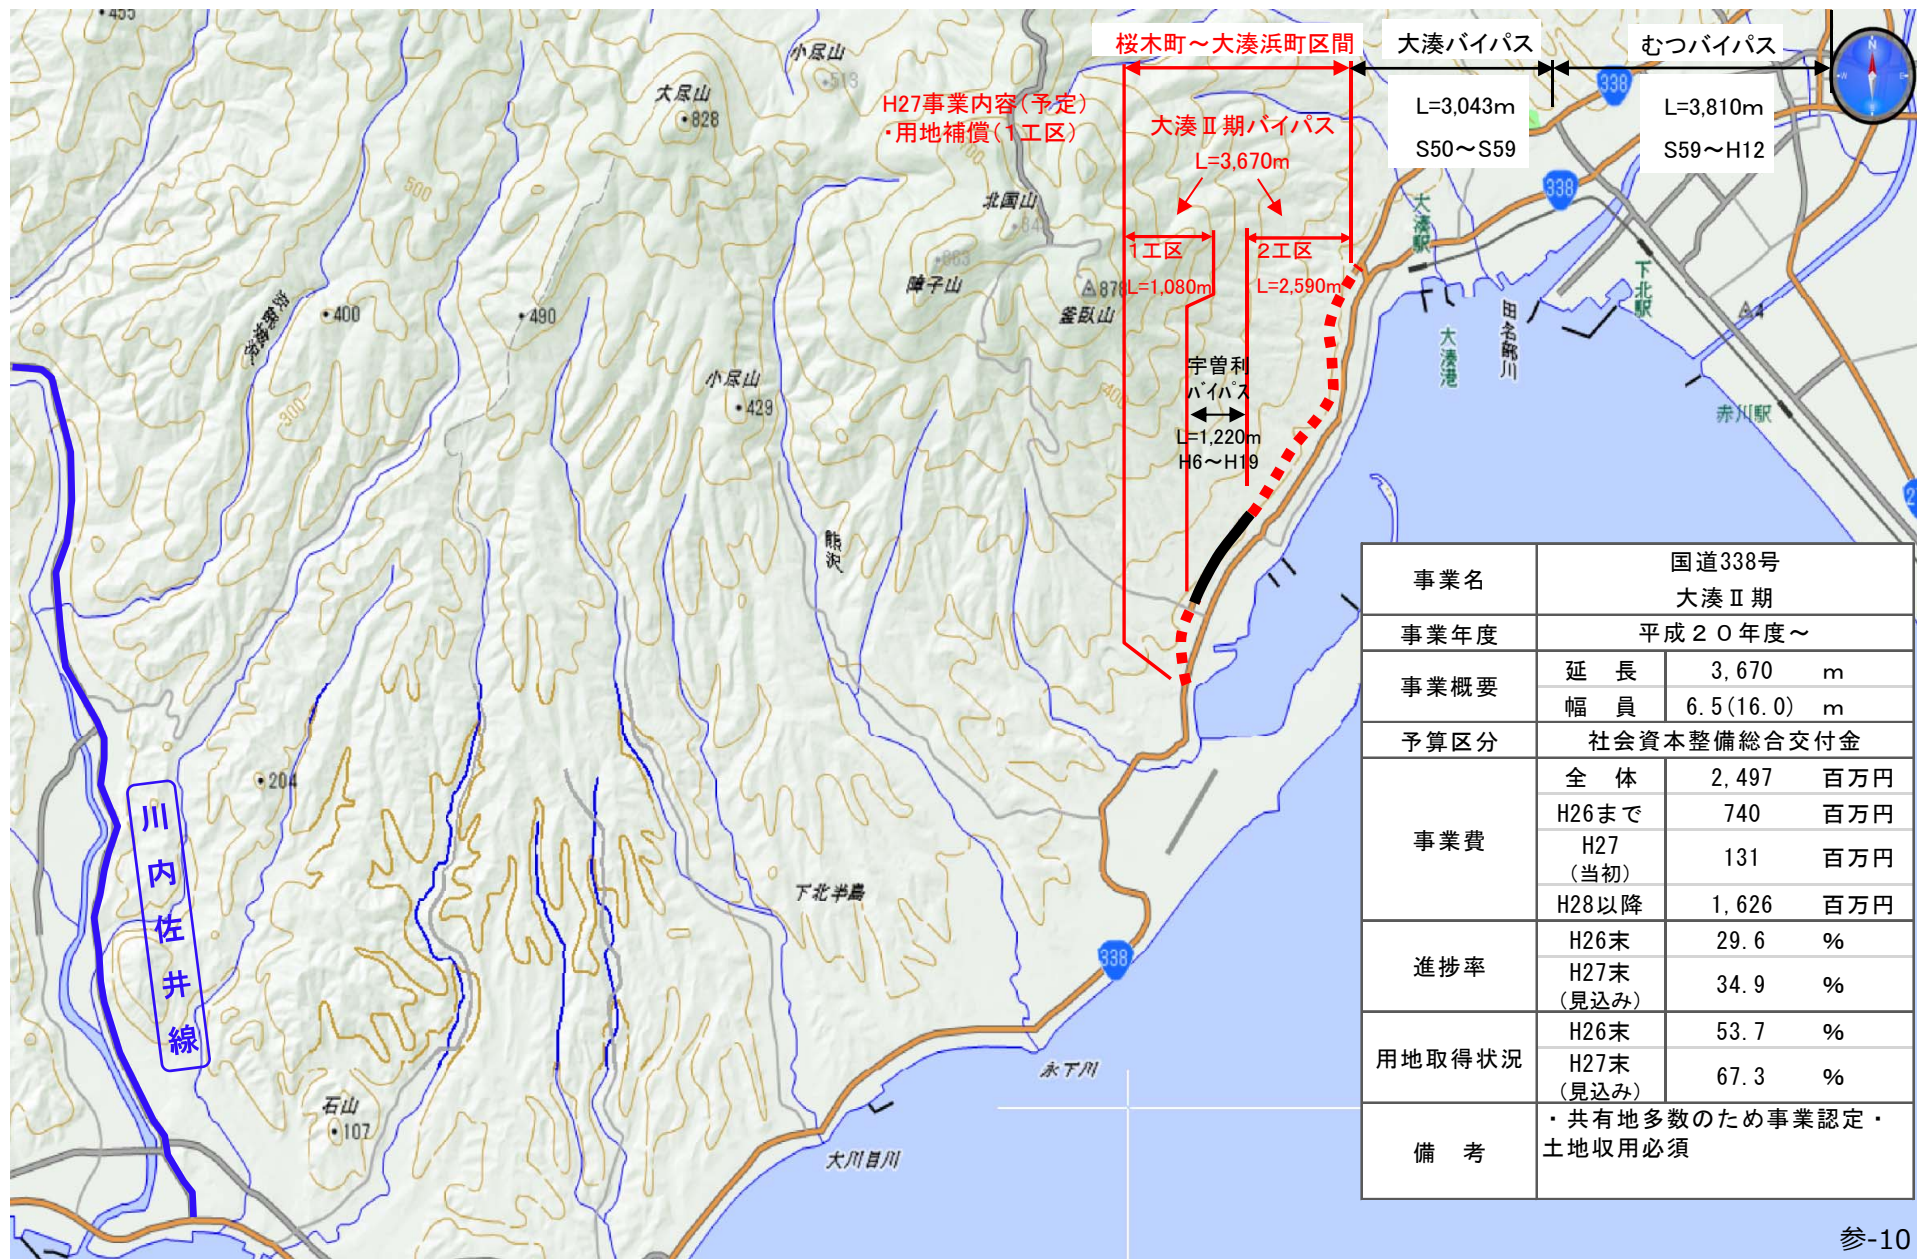

一般県道薬研佐井線 1.5車線整備事業【県事業】

青森県 県土整備部 道路課



事業名	県道薬研佐井線 道路整備事業	
事業年度	平成23年度～	
事業概要	延長	20,400 m
	幅員	4.0(5.0) m
予算区分	核燃料サイクル交付金 電源立地地域対策交付金	
事業費	全体	3,606 百万円
	H26まで	790 百万円
	H27(当初)	220 百万円
	H28以降	2,596 百万円
進捗率	H26末	21.9 %
	H27末(見込み)	28.0 %
用地取得状況	H26末	34.0 %
	H27末(見込み)	55.1 %
備考	・事業区間の大半が国有保安林であるため、森林管理者への買受・保安林解除申請が必要	

参-11
